

# 1. これまでのバリアフリーの取組について

## 1.1 北区交通バリアフリー基本構想の概要

北区では、平成 14 年度より「交通バリアフリー法」に基づいて「北区交通バリアフリー全体構想（以下、全体構想）」と駅別の交通バリアフリー基本構想を策定しています。

**全体構想**では、北区の交通バリアフリーに関する**基本的な考え方**などをまとめ、**重点整備地区を選定するための評価**を行っています。**駅別の基本構想**では、駅や周辺の道路、駅前広場、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、駅周辺の**重点整備地区**を定め、その整備方針や実施する**事業**などを位置づけました。これまで、東十条駅、王子駅、上中里駅、田端駅、板橋駅の各駅周辺交通バリアフリー基本構想を策定し、おおむね**平成 22 年度までを整備目標**として整備を進めてきました。

また、バリアフリー化を検討、協議を行う組織として北区交通バリアフリー協議会及び幹事会を平成 13 年 12 月に設置しています。これまで協議会を 18 回、幹事会を 17 回開催し、各駅周辺交通バリアフリー基本構想の事業進捗状況の把握や、関係機関等との情報交換を行ってきました。

今年度は、現在の基本構想の**評価や、課題の把握**を行い、**全体構想の改定**を行います。来年度以降、新たに**地区別のバリアフリー基本構想の策定**を進める予定としています。

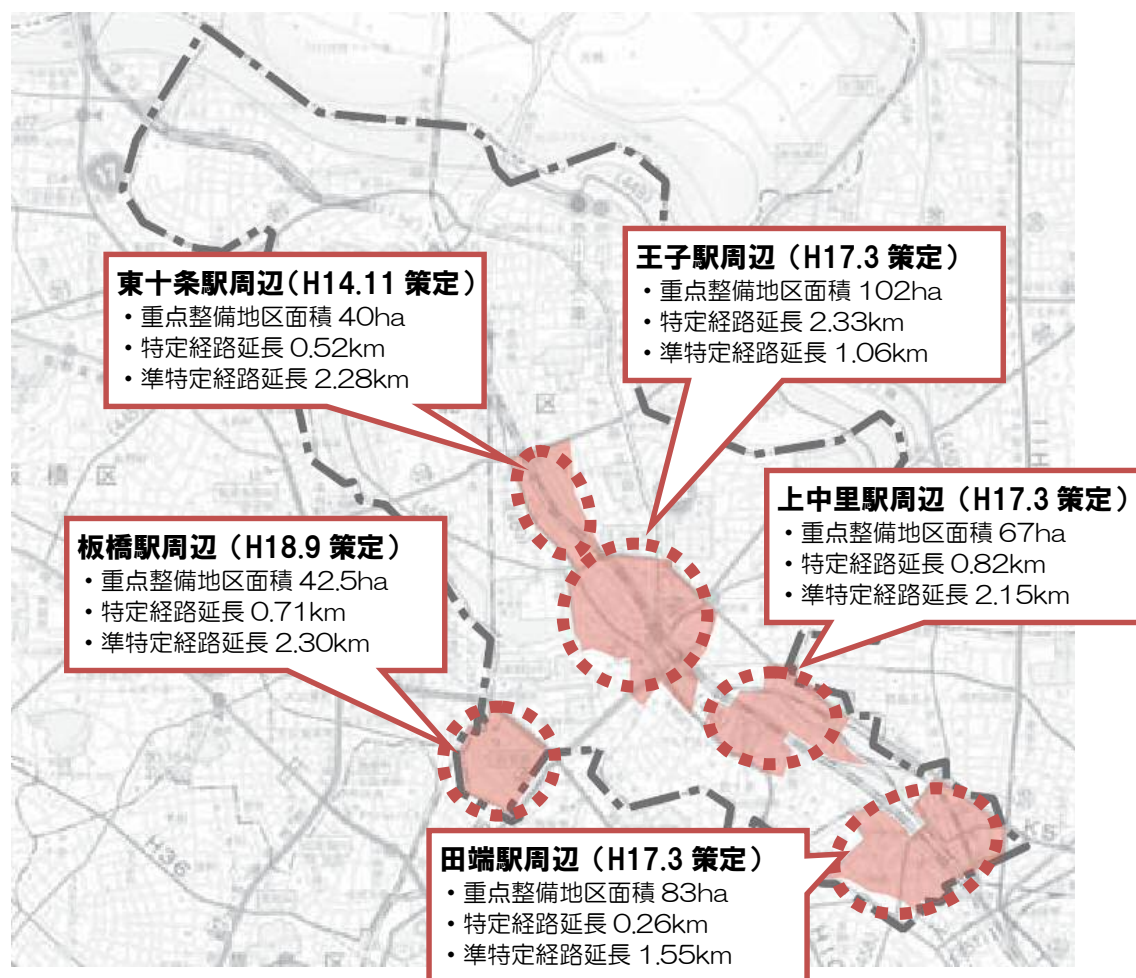



図 北区交通バリアフリー基本構想の策定状況

●これまでの検討の状況と今後の予定

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19～H26	H27	H28～
全体構想	全体構想							全体構想改定	
地区構想	東十条	王子・上中里・田端		板橋					順次策定
協議会	3回 東十条部会		3回	3回		進捗確認を 年1回実施		3回	複数回 実施予定
懇談会等	ヒアリング まち歩き		4回	4回 まち歩き					区民部会3回 (まち歩き含む) 複数回 実施予定

- 平成 12 年 11 月 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法) の施行
- 平成 14 年 11 月 交通バリアフリー法に基づき「北区交通バリアフリー基本構想」を策定【全体基本構想】及び【東十条駅周辺地区基本構想】の策定・公表
- 平成 17 年 3 月 【王子・上中里・田端駅周辺地区基本構想】の策定・公表
- 平成 18 年 9 月 【板橋駅周辺地区基本構想】の策定・公表
- 平成 18 年 12 月 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法) の施行 (法改正)
- ～平成 26 年度 基本構想に基づき進捗管理を年 1 回実施
- 平成 27 年度 北区バリアフリー基本構想策定協議会を設置  
バリアフリー法に基づき「北区バリアフリー基本構想」に改定【全体構想】の改定
- 平成 28 年度～ 【地区別基本構想】の検討を順次進める予定

●北区交通バリアフリー基本構想の位置づけ

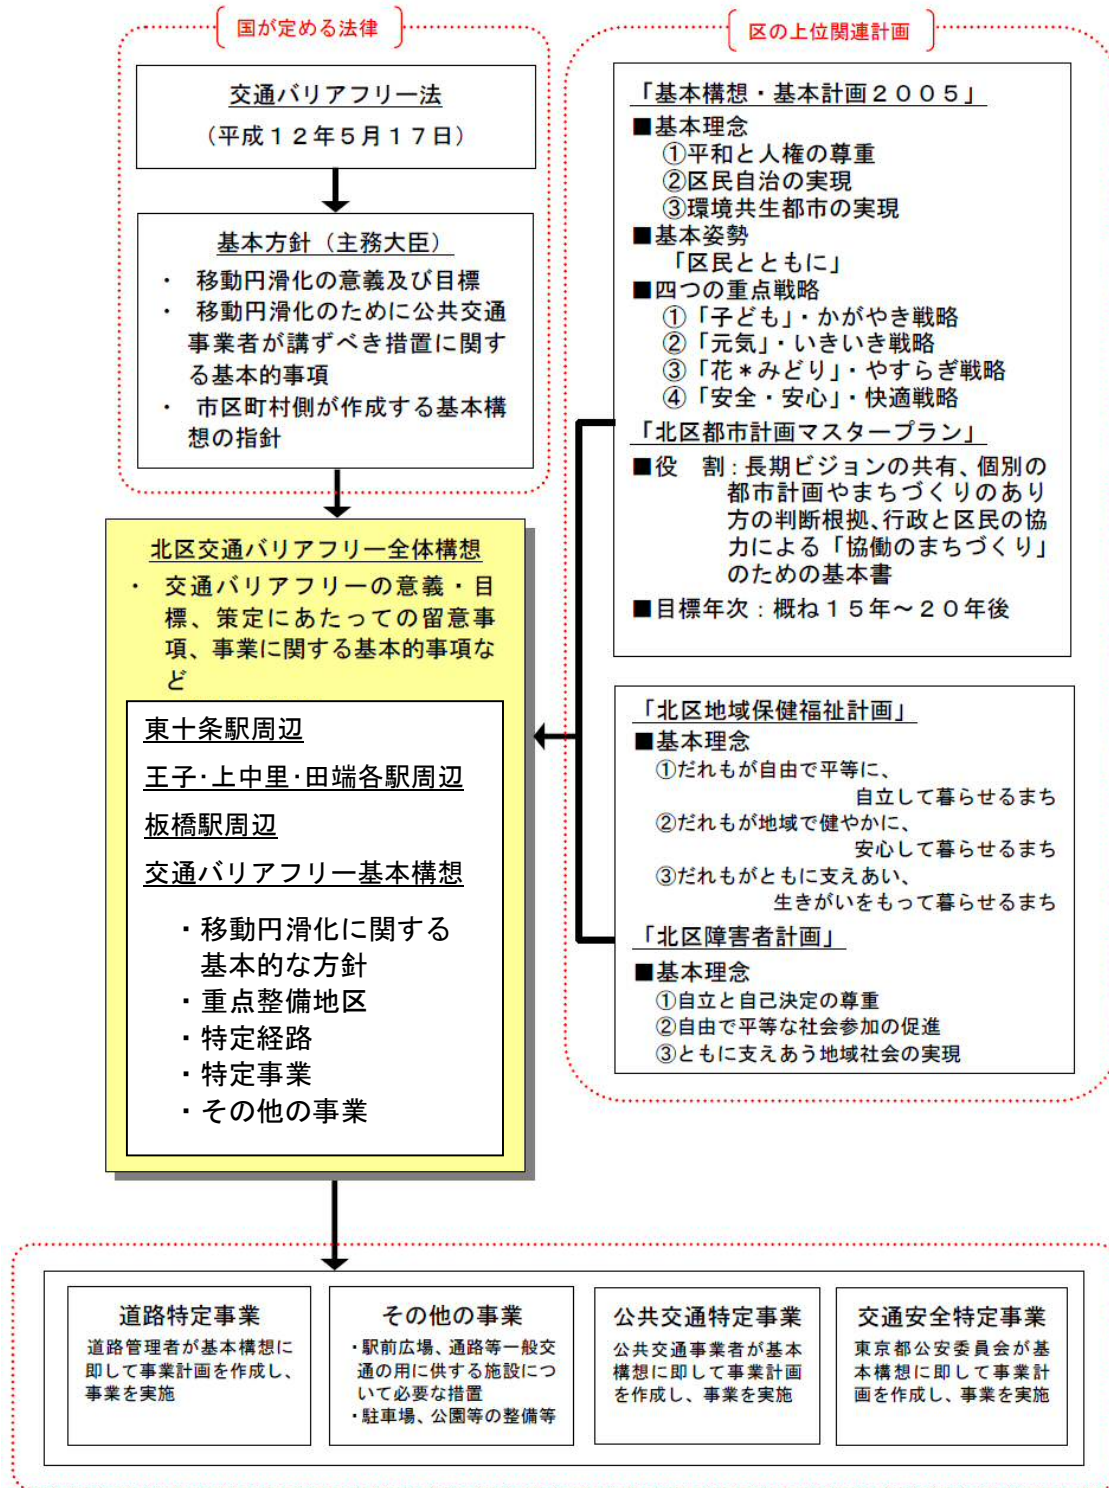

●北区交通バリアフリー基本構想（平成14年11月）の骨子

第1章	基本構想策定にあたって（策定の趣旨・位置付け・目標年次）
第2章	北区交通バリアフリー全体構想（交通バリアフリーの意義、目標、留意事項、重点整備地区に関する基本的な事項、特定事業に関する基本的な事項、その他の事項、重点整備地区の評価方法、重点整備地区選定評価表）
第3章	駅周辺交通バリアフリー基本構想（東十条駅周辺地区の構想と事業計画）
第4章	交通バリアフリー事業のフォローアップ

●協議会構成（平成 26 年時点）

区分		関係部署
官公庁	国	国土交通省関東運輸局交通環境部消費者行政・情報課
	東京都	都市整備局都市基盤部交通企画課
	北区	政策経営部企画課
		健康福祉部健康福祉課
まちづくり部都市計画課		
施設管理者	国	国土交通省東京国道事務所交通対策課
	東京都	第六建設事務所補修課
	北区	まちづくり部道路公園課
		まちづくり部工事課
まちづくり部交通担当課		
交通管理者	警視庁	赤羽警察署交通課
		王子警察署交通課
		滝野川警察署交通課
交通事業者	鉄道	東日本旅客鉄道(株)東京支社総務部企画室
		東京地下鉄(株)鉄道本部改良建設部設計課
		東京都交通局総務部総合計画課
	バス	東京都交通局自動車部計画課
国際興業(株)運輸事業部業務課		
区民	障害者	北区障害者団体連合会
	高齢者	北区シニアクラブ連合会
	自治体	北区自治会連合会
	商店街	北区商店街連合会
事務局		北区まちづくり部都市計画課

## 1.2 基本構想の事業計画の進捗状況

北区交通バリアフリー基本構想の中で定められた事業計画は下表のような進捗状況となっています。

地区全体では、約85%の整備率で、上中里駅周辺地区はすべての事業が完了しています。未完了の事業は主に道路特定事業・その他の事業であり、板橋駅周辺に関しては公共交通特定事業が未完了という状況となっています。

### ●事業計画進捗状況

地区	事業区分	進捗状況			事業数	整備率
		継続	完了	未完了		
東十条駅周辺 (H14.11 策定)	道路特定事業・その他事業	7	19	7	33	78.8%
	公共交通特定事業	0	3	0	3	100.0%
	交通安全特定事業	5	1	0	6	100.0%
	継続して検討すべき事項					
	地区全体	12	23	7	42	83.3%
王子駅周辺 (H17.3 策定)	道路特定事業・その他事業	2	10	1	13	92.3%
	公共交通特定事業	1	3	0	4	100.0%
	交通安全特定事業	3	1	0	4	100.0%
	継続して検討すべき事項	1	2	0	3	
	地区全体	6	14	1	21	95.2%
上中里駅周辺 (H17.3 策定)	道路特定事業・その他事業	2	9	0	11	100.0%
	公共交通特定事業	0	1	0	1	100.0%
	交通安全特定事業	2	0	0	2	100.0%
	継続して検討すべき事項	0	2	1	3	
	地区全体	4	10	0	14	100.0%
田端駅周辺 (H17.3 策定)	道路特定事業・その他事業	2	6	5	13	61.5%
	公共交通特定事業	0	3	0	3	100.0%
	交通安全特定事業	3	0	0	3	100.0%
	継続して検討すべき事項	0	1	2	3	
	地区全体	5	9	5	19	73.7%
板橋駅周辺 (H18.9 策定)	道路特定事業・その他事業	3	9	2	14	85.7%
	公共交通特定事業	0	0	2	2	0.0%
	交通安全特定事業	2	1	0	3	100.0%
	継続して検討すべき事項	0	1	1	2	
	地区全体	5	10	4	19	78.9%
区内全体		32	66	17	115	85.2%

●主な実施事業

地区	事業内容	写真
東十条駅 周辺	<ul style="list-style-type: none"> <li>○北口東側にエレベーター、エスカレーターの設置</li> <li>○北口東側の公衆トイレを「だれでもトイレ」に変更</li> <li>○北口とホームの間にエスカレーター、エレベーターを設置</li> <li>○北口・南口の車いす対応用に券売機周辺の改修（写真1）</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">写真1</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○駅北口西側にエレベーター等設置（写真2）</li> <li>○東十条2丁目高架下児童遊園の出入口にスロープを設置</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">写真2</p>
王子駅 周辺	<ul style="list-style-type: none"> <li>○南口駅前交通広場の整備</li> <li>○音無親水公園付近にエレベーター等設置</li> <li>○王子駅前公園のバリアフリー化</li> <li>○ホームと改札口間にエレベーター設置（写真3）</li> <li>○コンコースに多機能トイレ設置</li> <li>○音声信号の設置</li> <li>○飛鳥山公園付近の昇降機設置検討（写真4）</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">写真3</p>  <p style="text-align: center;">写真4</p>

地区	事業内容	写真
<p>上中里駅 周辺</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○コンコースに多機能トイレ設置（写真5）</li> <li>○車坂跨線人道橋の東端にエレベーター等設置</li> <li>○本郷通りの横断歩道橋（西ヶ原歩道橋）設置箇所における歩道有効幅員の拡幅検討</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">写真5</p>
<p>田端駅 周辺</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○田端ふれあい橋の東端にエレベーター等設置（写真6）</li> <li>○ホームと改札口間にエレベーター設置</li> <li>○コンコースに多機能トイレ設置</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">写真6</p>
<p>板橋駅 周辺</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○信号機のバリアフリー化</li> <li>○滝野川西区民センターへの案内標識の改修（写真7）</li> <li>○南谷端公園のバリアフリー化</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">写真7</p>

●未完了事業一覧（17事業）

地区	事業内容	事業量
東十条駅周辺	歩行者自転車専用道路の指定	0.23km
	歩道有効幅員拡幅に伴う整備	0.24km
	歩道の防護柵改修、段差解消、勾配見直し、舗装改修等、点字ブロック等再整備	0.24km
	補助 89 号線の歩道幅員改良工事	0.35km
	東十条 2 丁目高架下駅前公衆便所を「だれでもトイレ」に変更	1 箇所
	中十条公園に「だれでもトイレ」の設置と出入口にスロープを設置	1 箇所
	駐輪場の新設	1 箇所
王子駅周辺	点字ブロックの設置	対象区間の未設置区間 :特 0.17km、準 0.78km
上中里駅周辺	無し	—
田端駅周辺	歩道の段差解消	対象区間の問題部分すべて :特 0.06km、準 0.53km
	点字ブロックの設置	対象区間の未設置区間 :特 0.06km、準 0.53km
	舗装凹凸の解消(透水性への改善含む)	対象区間で改良の必要性が高い部分 :特 0.06km、準 0.53km
	点字ブロックの設置	対象区間の未設置区間:準 1.02km
	駅西側の高台に行くエレベーター等設置	1 箇所
板橋駅周辺	街路と駅前広場の一体的なバリアフリー化	特 0.71km、駅前広場 0.18ha
	エレベーター、エスカレーターの設置	入口～ホームの間
	多機能トイレの設置	1 箇所
	誘導案内板の改修	1 箇所
